

진행계획

시간		주요 내용	비고
13:00 ~ 13:50	50'	▶ 참가자 등록 및 입장	참석자 QR 등록
14:00 ~ 14:10	10'	▶ 사업 개요 및 행사 목적 소개	안병희 주무관
14:10 ~ 14:15	5'	▶ 인사말씀	김숙화 사무관
14:15 ~ 14:20	5'	▶ 서비스 이관 담당자 소개 및 협조요청	사업단 이경상 이사
14:20 ~ 15:00	40'	▶ 서비스 이관 절차 및 단계별 역할 설명	사업단 김길수 이사
15:00 ~ 15:30	30'	▶ 질의 응답	전체
15:30 ~ 15:35	5'	▶ 행운권 추첨	QR 코드 등록대상
15:35 ~ 15:40	5'	▶ 당부말씀	정보화담당관
15:40		▶ 종료	사회자



본청/직속기관 서비스 이관 및 안정화 계획

본청 및 직속기관 담당자·유지보수 사업자 대상 업무 협의회

이관 협의회 개요 및 목적

목적

경기도교육청 정보자원통합의
본청·직속기관 서비스 이관
일정 및 방법을 공유하고,

**안정적인 이관을 위한 역할과
책임을 정의함**

협의회 개요

일시 및 장소

2026. 1. 16.(금) 14:00~16:00

경기도교육청 2층 컨퍼런스룸

참석 대상

- 본청·직속기관 업무 담당자
(관리/감독)
- 유지보수 업체 담당자
(HW / 상용SW / 응용SW 실무 수행)

안정적 서비스 이관을 위한 기관과 유지보수 업체의 긴밀한 협력 필수

주요 협의 안건

01

이관 대상 서비스 재점검

본청·직속기관 대상 식별 확인 및 누락 방지

02

이관 일정 및 연계성 확인

서비스 이관 일정 확정, 연계 서비스 및 방화벽 정책 검토

03

R&R 및 사전 조치 공유

Task별 기관 및 유지보수 업체의 명확한 역할 정의

04

특이사항 및 이슈 논의

이관 시 발생 가능한 기술적/운영적 특이사항 의견 수렴

유지보수 업체 필수 협조사항

성공적인 이관을 위한 8대 핵심 과제

보안 조치

웹 취약점 점검 수행,
조치 완료 및 결과
공문 발송

시나리오

서비스 점검 상세
시나리오 작성 및 제출

사전 테스트

Test 전환 및 서비스
기능 점검 진행

네트워크

연계 서비스 확인 및
방화벽 정책 정리/최적화

작업 수행

이관 서비스 서버 및 DB
재기동 등 실무 작업
(이상 유무 체크)

결과 보고

서비스 점검 수행 결과
보고서 제출

장애 대응

AP 서비스 장애 발생 시
공동 대응 수행

상주 근무

**이관 실행 시 기록원
상주근무 요청**

(금)14:00 ~ (토)18:00

단계별 이관 절차 및 R&R 정의

Step 1: 사전 작업



기관 담당자

- 소스 취약점 점검 결과 공문 제출
- 소스 취약점 점검 및 조치 관리



유지보수 사업자

- 서비스 점검 시나리오 작성 및 제출 (필수)
- 소스 취약점 점검 기술 지원 및 조치 수행

단계별 이관 절차 및 R&R 정의

2단계: Test 전환 점검

오픈
2주 전
(D-14)

인프라 확인

- [기관] TEST 전환서버 확인 승인
- [업체] TEST 전환대상 서버 확인 (CPU, 메모리, Disk)

네트워크/보안

- [기관] 방화벽 점검 승인
- [업체] 방화벽 점검, VM 정상 기동 여부 확인, OS로그 점검

기동 및 검증

- [업체] 네트워크 설정변경확인, IP변경에 따른 APP/소스 네트워크 설정 변경
- 주요 어플리케이션 정상동작 확인, Test 서비스 점검 진행
- 신규서비스 기동 (WEB,WAS,DB) 확인 , 외부연계 테스트 진행

결과 보고

- [업체] Test 서비스 점검 완료 후 점검내용 작성

단계별 이관 절차 및 R&R 정의

3단계: 본 전환 준비
(D-Day)

Step 3: 전환 대상 서버 확인

- [기관] 전환 대상 서버확인 승인
- [업체] 전환대상 서버 확인 (CPU, 메모리, Disk)

Step 4: 전환 환경 준비

- [기관] 방화벽 점검 승인
- [업체] 방화벽 점검

Step 5: 서비스 종료 (Service Shutdown)

- ⚠ [기관] 전환 일정 사용자 공지확인 , WEB-WAS-DB 종료확인
- ⚠ [업체] 전환 일정 사용자 공지 안내 (WEB방화벽 공지포함)
- ⚠ [업체] 전환 대상 서비스 종료(WEB,WAS,DB)

단계별 이관 절차 및 R&R 정의

3단계: 마이그레이션 실행



단계별 이관 절차 및 R&R 정의

3단계: 서비스 검증 및 전환

Step 11: 서비스 검증

- ☞ [기관] 모니터링 및 데이터 무결성 검증 감독
- ☞ [업체] 데이터/파일 무결성 검증
 - 네트워크 설정 변경확인
 - IP변경에 따른 어플리케이션/소스 네트워크 변경
 - 서비스 오픈전 정상 동작 여부 확인

Step 12: 서비스 전환

- ☞ [기관] 모니터링
- ☞ [업체] DNS 전환 확인
 - 신규 서비스 기동(WEB, WAS, DB) 확인

단계별 이관 절차 및 R&R 정의

4단계: 안정화

Step 13: 테스트

- ☞ [기관] 서비스 점검 진행
 - ☞ [업체] 외부 연계 테스트 진행(중요)
전환 오픈 후 서비스 점검 진행
-

Step 14: 서비스 안정화

- ☞ [기관] 모니터링
- ☞ [업체] 서비스 로그 및 DB 세션 정상 여부 확인
리소스(CPU/MEM) 사용량 및 성능 모니터링

설명회(1.16) 이후 추진계획



* 이전 테스트 대상 기관은 사전 방문 협의 후 진행

준비단계 협조요청사항

ACTION
01

현장 실사 협조
(1.16 ~ 1.30)

유지보수 업체와 사업단 간의 시스템 현황표 작성에 적극 협조 요망. 누락된 자산이나 특이사항이 없는지 정밀 확인 필수.

ACTION
02

테스트 일정 준수
(2.2 ~ 2.27)

할당된 테스트 일정에 맞춰 엔지니어 리소스 확보 필수. 사전 방문 협의 시 적극적인 이슈 공유 요망.

ACTION
03

비상 연락망 가동

이관 기간 중 24시간 연락 가능한 비상 연락체계 현행화.

직속기관 이관대상

구분	기관명	업무명	웹취약점 점검	서비스전환일정	비고
직속기관	경기도교육정보기록원 (현장정보지원부)	학교정보화현장지원시스템	2월말	26.3.6.~7	
		경기교육모아 (교수학습분야 홈페이지 통합시스템)	2월말		교육모아
	경기도교육청북부유아 체험교육원	대표홈페이지	2월말	26.2.27.~28	시범(양평)
	경기도교육청안전교육관	대표홈페이지	2월말	26.3.6.~7	
	경기도교육청북부연수원	대표홈페이지	2월말	26.3.6.~7	
	경기도교육청학생교육원	대표홈페이지	2월말	26.3.6.~7	
	경기교육청중앙교육 도서관	통합홈페이지	2월말	26.3.27.~28	
		통합자료관리시스템	2월말	26.3.27.~28	
		좌석예약홈페이지	2월말	26.3.27.~28	
		정보나루	2월말	26.3.27.~28	
		챗봇서버	2월말	26.3.27.~28	
		자료검색대(K-CMS)	2월말	26.3.27.~28	
		책이음	2월말	26.3.27.~28	
	교육모아 HCI서버에 할당	미디어교육센터	2월말	26.3.13.~14	교육모아
		공용차량배치	2월말	26.3.13.~14	교육모아
		남부연수원 연수시설예약	2월말	26.3.13.~14	교육모아

본청 이관대상

구분	기관명	업무명	웹취약점 점검	서비스전환일정	비고
본청	정보화담당관	대표홈페이지	3월말	26.4.24.~25	
		교육용 클라우드서비스 지원시스템	3월말	26.4.17.~18	
	생활교육과	온마음터 학교폭력 사안처리종합지원시스템	3월말	26.4.17.~18	
	시설과	설계공모심사시스템	3월말	26.4.17.~18	
		신기술·특허공법 선정시스템	3월말	26.4.17.~18	
		교육시설공사관리 플랫폼 구축	3월말	26.4.17.~18	
	정책기획관	정책제안 플랫폼 (e정책장터)	3월말	26.4.10.~11	교육모아
		기관평가시스템	3월말	26.4.10.~11	양평
		기관평가시스템(대국민)	3월말	26.4.10.~11	
	지역교육정책과	공유학교 통합시스템	3월말	26.4.10.~11	가평
	진로직업교육과	AI 기반 진로진학시스템	3월말	26.4.10.~11	
	정보화담당관	디지털플랫폼 AI학습데이터 저장소 (VM15개)	3월말	26.4.10.~11	양평

vMotion 이용한 시스템 이관 절차

출발지 : 본청/직속기관

목적지 : 경기도 교육정보기록원

이관 대상 시스템

본청 및 직속기관에서
운영되고 있는 업무시스템
Vcenter Server의 VM서버

Advanced Cross vCenter
vMotion 실행

서로다른 Vcenter Server 환경간에
VM을 실시간으로 이동시키는 기술

최종 도착지 환경


이관된 업무시스템이 최종적으로
운영되는 목적지(정보기록원)
Vcenter Server VM



방화벽

스쿨넷 망을 통한 데이터 전송

출발지와 목적지간의 모든 VM 데이터는 경
기도교육청 스텔넷 망을 통해 안전하게 전송

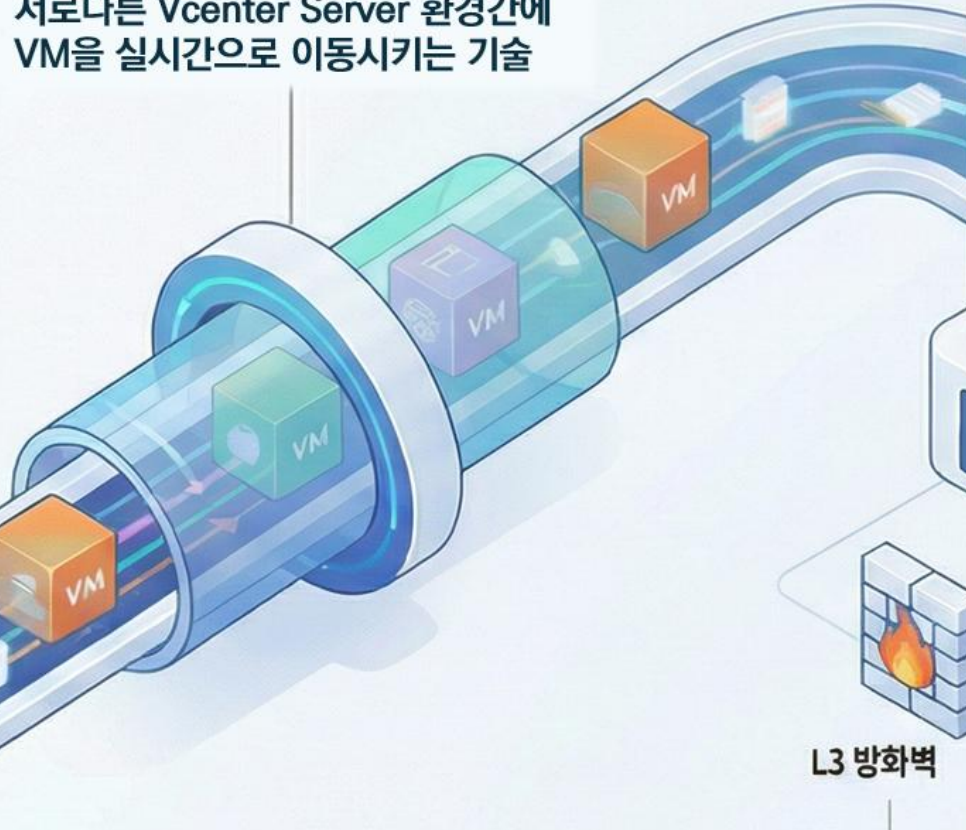


L3 방화벽

L2 스위치



VMware Converter를 이용한 시스템 이관 절차

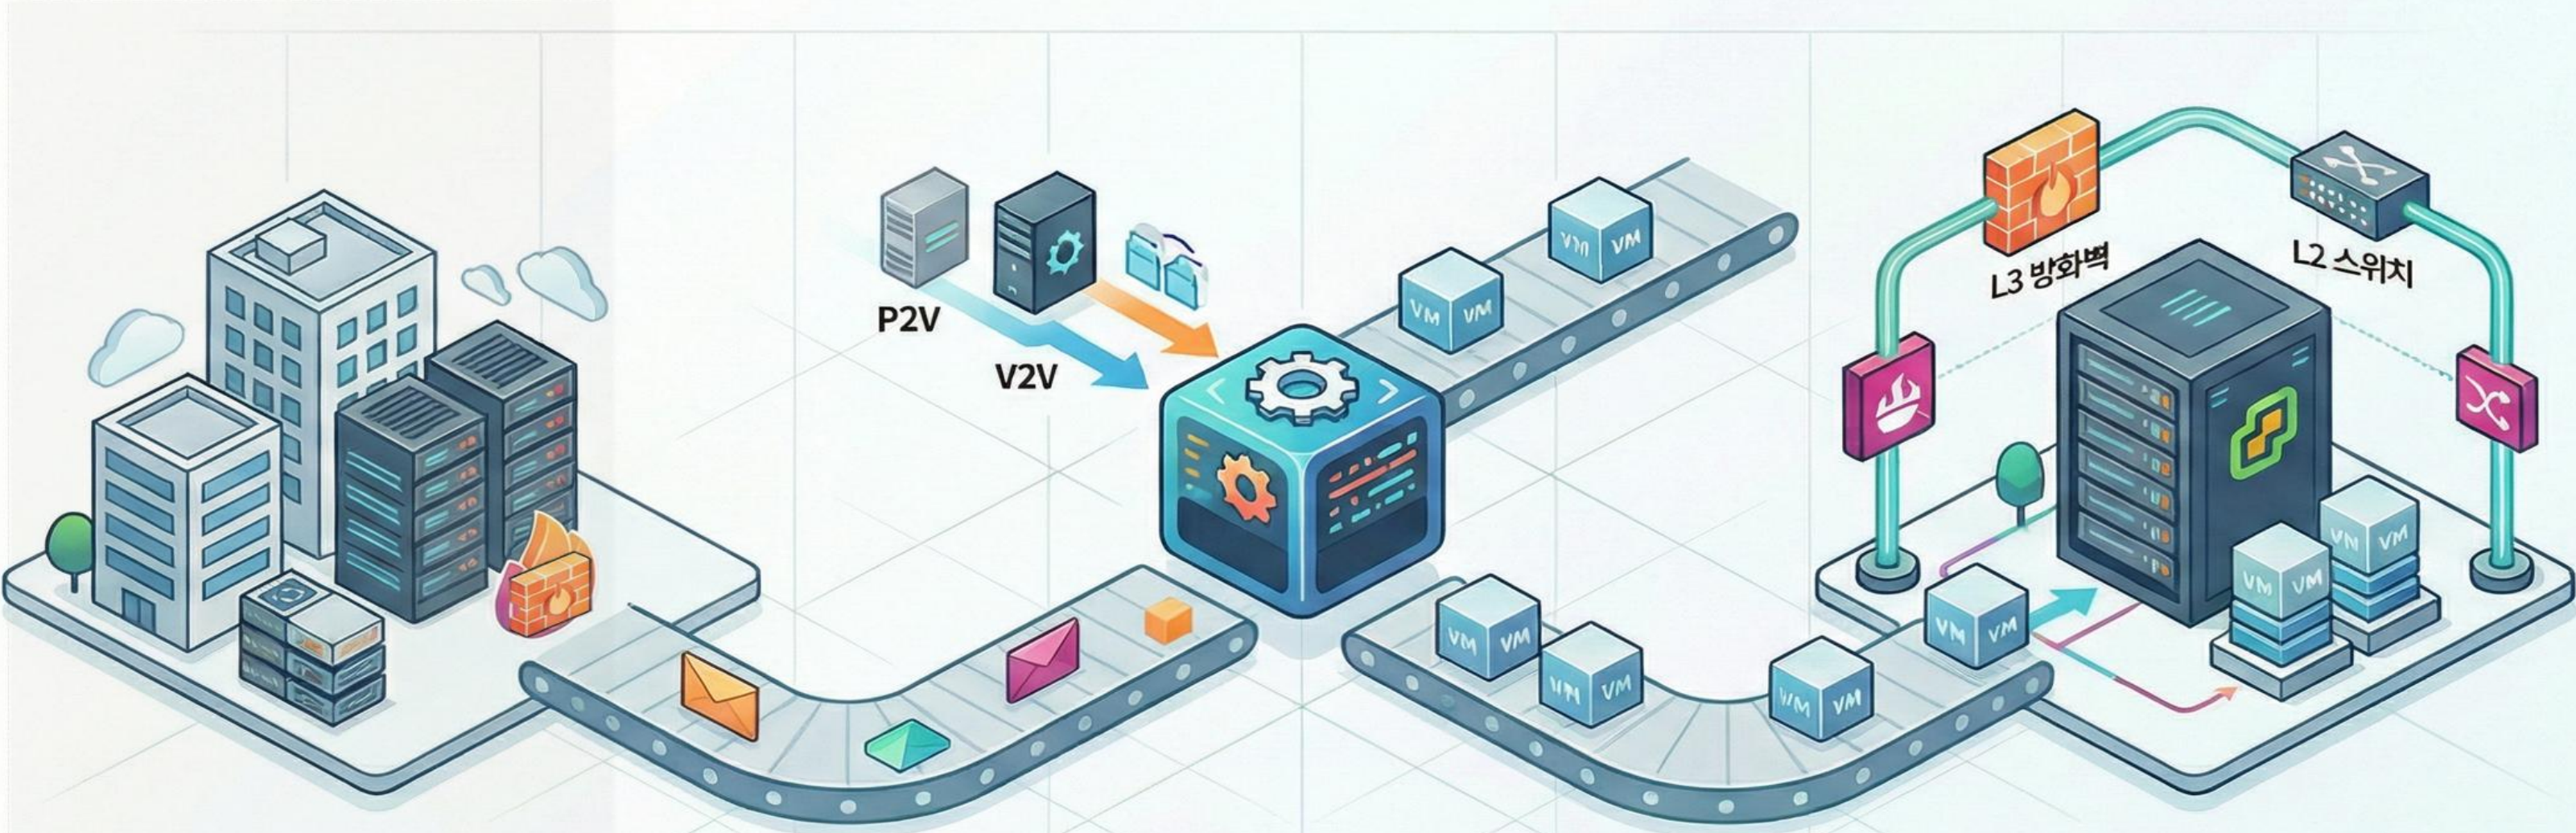

1. 출발지 : 본청/직속기관

이관대상이 되는 본청/직속기관 업무시스템

2. 전송경로 : 스쿨넷

출발지와 목적지간의 모든 VM 데이터는 경기도교육청 스쿨넷 망을 통해 안전하게 전송

3. 변환 : VMware Converter

VMware Vcenter Converter 도구로 P2V, V2V 변환

4. 목적지 : 경기도교육정보기록원

P2V, V2V로 변환된 시스템 vCenter VM 으로 생성 및 배포

문의 및 기술 지원

有備無患 事半功倍(유비무환 사반공배)

미리 준비하면 향후 작은 노력으로 큰성과를 이룬다


시스템 이전 프로젝트: 주요 담당자 연락처



이경상 이사
(프로젝트 PM)

010-7732-2523

시스템 이전 총괄



김길수 이사
(이전통합 팀장)

010-6526-8823

시스템 이전 전략 담당



이운재 이사
(이전통합 기술)

010-9210-0108

이전 시스템 정보 취합
및 관리



박용희 이사
(사업관리 팀장)

010-5314-0823

사업 협력 및 협약 관리

계획은 정교하게 ! 실행은 철저하게 ! 결과는 성공으로!
