



본청/직속기관 서비스 이관 및 안정화 계획

본청 및 직속기관 담당자·유지보수 사업자 대상 업무 협의회

이관 협의회 개요 및 목적

목적

경기도교육청 정보자원통합의
본청·직속기관 서비스 이관
일정 및 방법을 공유하고,

**안정적인 이관을 위한 역할과
책임을 정의함**

협의회 개요

일시 및 장소

2026. 1. 16.(금) 14:00~16:00
경기도교육청 4층 회의실

참석 대상

- 본청·직속기관 업무 담당자
(관리/감독)
- 유지보수 업체 담당자
(HW / 상용SW / 응용SW 실무 수행)

안정적 서비스 이관을 위한 기관과 유지보수 업체의 긴밀한 협력 필수

주요 협의 안건

01

이관 대상 서비스 재점검

본청·직속기관 대상 식별 확인 및 누락 방지

02

이관 일정 및 연계성 확인

서비스 이관 일정 확정, 연계 서비스 및 방화벽 정책 검토

03

R&R 및 사전 조치 공유

Task별 기관 및 유지보수 업체의 명확한 역할 정의

04

특이사항 및 이슈 논의

이관 시 발생 가능한 기술적/운영적 특이사항 의견 수렴

유지보수 업체 필수 협조사항

성공적인 이관을 위한 8대 핵심 과제

보안 조치

웹 취약점 점검 수행,
조치 완료 및 결과
공문 발송

시나리오

서비스 점검 상세
시나리오 작성 및 제출

사전 테스트

Test 전환 및 서비스
기능 점검 진행

네트워크

연계 서비스 확인 및
방화벽 정책 정리/최적화

작업 수행

이관 서비스 서버 및 DB
재기동 등 실무 작업
(이상 유무 체크)

결과 보고

서비스 점검 수행 결과
보고서 제출

장애 대응

AP 서비스 장애 발생 시
공동 대응 수행

상주 근무

**이관 실행 시 기록원
상주근무 요청**

(금)14:00 ~ (토)18:00

단계별 이관 절차 및 R&R 정의

Step 1: 사전 작업



기관 담당자

- 소스 취약점 점검 결과 공문 제출
- 소스 취약점 점검 및 조치 관리



유지보수 사업자

- 서비스 점검 시나리오 작성 및 제출 (필수)
- 소스 취약점 점검 기술 지원 및 조치 수행

단계별 이관 절차 및 R&R 정의

2단계: Test 전환 점검

오픈
2주 전
(D-14)

인프라 확인

- [기관] TEST 전환서버 확인 승인
- [업체] TEST 전환대상 서버 확인 (CPU, 메모리, Disk)

네트워크/보안

- [기관] 방화벽 점검 승인
- [업체] 방화벽 점검, VM 정상 기동 여부 확인, OS로그 점검

기동 및 검증

- [업체] 네트워크 설정변경확인, IP변경에 따른 APP/소스 네트워크 설정 변경
- 주요 어플리케이션 정상동작 확인, Test 서비스 점검 진행
- 신규서비스 기동 (WEB,WAS,DB) 확인 , 외부연계 테스트 진행

결과 보고

- [업체] Test 서비스 점검 완료 후 점검내용 작성

단계별 이관 절차 및 R&R 정의

3단계: 본 전환 준비
(D-Day)

Step 3: 전환 대상 서버 확인

- [기관] 전환 대상 서버확인 승인
- [업체] 전환대상 서버 확인 (CPU, 메모리, Disk)

Step 4: 전환 환경 준비

- [기관] 방화벽 점검 승인
- [업체] 방화벽 점검

Step 5: 서비스 종료 (Service Shutdown)

- ⚠ [기관] 전환 일정 사용자 공지확인 , WEB-WAS-DB 종료확인
- ⚠ [업체] 전환 일정 사용자 공지 안내 (WEB방화벽 공지포함)
- ⚠ [업체] 전환 대상 서비스 종료(WEB,WAS,DB)

단계별 이관 절차 및 R&R 정의

3단계: 마이그레이션 실행



단계별 이관 절차 및 R&R 정의

3단계: 서비스 검증 및 전환

Step 11: 서비스 검증

- ☞ [기관] 모니터링 및 데이터 무결성 검증 감독
- ☞ [업체] 데이터/파일 무결성 검증
 - 네트워크 설정 변경확인
 - IP변경에 따른 어플리케이션/소스 네트워크 변경
 - 서비스 오픈전 정상 동작 여부 확인

Step 12: 서비스 전환

- ☞ [기관] 모니터링
- ☞ [업체] DNS 전환 확인
 - 신규 서비스 기동(WEB, WAS, DB) 확인

단계별 이관 절차 및 R&R 정의

4단계: 안정화

Step 13: 테스트

- ☞ [기관] 서비스 점검 진행
 - ☞ [업체] 외부 연계 테스트 진행(중요)
전환 오픈 후 서비스 점검 진행
-

Step 14: 서비스 안정화

- ☞ [기관] 모니터링
- ☞ [업체] 서비스 로그 및 DB 세션 정상 여부 확인
리소스(CPU/MEM) 사용량 및 성능 모니터링

설명회(1.16) 이후 추진계획



* 이전 테스트 대상 기관은 사전 방문 협의 후 진행

준비단계 협조요청사항

ACTION
01

현장 실사 협조
(1.16 ~ 1.30)

유지보수 업체와 사업단 간의 시스템 현황표 작성에 적극 협조 요망. 누락된 자산이나 특이사항이 없는지 정밀 확인 필수.

ACTION
02

테스트 일정 준수
(2.2 ~ 2.27)

할당된 테스트 일정에 맞춰 엔지니어 리소스 확보 필수. 사전 방문 협의 시 적극적인 이슈 공유 요망.

ACTION
03

비상 연락망 가동

이관 기간 중 24시간 연락 가능한 비상 연락체계 현행화.

직속기관 이관대상

구분	기관명	업무명	웹취약점 점검	서비스전환일정	비고
직속기관	경기도교육정보기록원 (현장정보지원부)	학교정보화현장지원시스템	2월말	26.3.6.~7	
		경기교육모아 (교수학습분야 홈페이지 통합시스템)	2월말		교육모아
	경기도교육청북부유아 체험교육원	대표홈페이지	2월말	26.2.27.~28	시범(양평)
	경기도교육청안전교육관	대표홈페이지	2월말	26.3.6.~7	
	경기도교육청북부연수원	대표홈페이지	2월말	26.3.6.~7	
	경기도교육청학생교육원	대표홈페이지	2월말	26.3.6.~7	
	경기교육청중앙교육 도서관	통합홈페이지	2월말	26.3.27.~28	
		통합자료관리시스템	2월말	26.3.27.~28	
		좌석예약홈페이지	2월말	26.3.27.~28	
		정보나루	2월말	26.3.27.~28	
		챗봇서버	2월말	26.3.27.~28	
		자료검색대(K-CMS)	2월말	26.3.27.~28	
		책이음	2월말	26.3.27.~28	
	교육모아 HCI서버에 할당	미디어교육센터	2월말	26.3.13.~14	교육모아
		공용차량배치	2월말	26.3.13.~14	교육모아
		남부연수원 연수시설예약	2월말	26.3.13.~14	교육모아

본청 이관대상

구분	기관명	업무명	웹취약점 점검	서비스전환일정	비고
본청	정보화담당관	대표홈페이지	3월말	26.4.24.~25	
		교육용 클라우드서비스 지원시스템	3월말	26.4.17.~18	
	생활교육과	온마음터 학교폭력 사안처리종합지원시스템	3월말	26.4.17.~18	
	시설과	설계공모심사시스템	3월말	26.4.17.~18	
		신기술·특허공법 선정시스템	3월말	26.4.17.~18	
		교육시설공사관리 플랫폼 구축	3월말	26.4.17.~18	
	정책기획관	정책제안 플랫폼 (e정책장터)	3월말	26.4.10.~11	교육모아
		기관평가시스템	3월말	26.4.10.~11	양평
		기관평가시스템(대국민)	3월말	26.4.10.~11	
	지역교육정책과	공유학교 통합시스템	3월말	26.4.10.~11	가평
	진로직업교육과	AI 기반 진로진학시스템	3월말	26.4.10.~11	
	정보화담당관	디지털플랫폼 AI학습데이터 저장소 (VM15개)	3월말	26.4.10.~11	양평

문의 및 기술 지원

有備無患 事半功倍(유비무환 사반공배)

미리 준비하면 향후 작은 노력으로 큰성과를 이루다

정보자원통합 프로젝트 사업단

프로젝트 PM : 이경상 이사 [010-7732-2523]

이전통합 팀장 : 김길수 이사 [010-6526-8823]

사업관리 팀장 : 박용희 이사 [010-5314-0823]

계획은 정교하게 ! 실행은 철저하게 ! 결과는 성공으로!

경기도교육청 정보자원통합 본청·직속기관 서비스 이관 협의

1. 개 요

- 경기도교육청 정보자원통합의 본청·직속기관 서비스 이관일정 및 서비스 이관 방법 등 안정적으로 이관하기 위한 협의회 진행

2. 협의회 일시

- 협의회 일시
 - 2026.1.16.(금) 14:00~16:00
- 협의회 장소
 - 경기도교육청 2층 회의실
- 참석대상
 - 본청·직속기관 담당자
 - 본청·직속기관 유지보수 업체 담당자(HW/상용SW/응용SW)

3. 주요내용

- 본청·직속기관 대상 서비스 재 점검(이관대상 식별 확인)
- 본청·직속기관 서비스 이관 일정 협의
- 본청·직속기관 연계서비스 확인 및 방화벽 정책 확인
- 본청·직속기관 서비스 이관 시 R&R 및 사전 조치 내용 공유
- 본청·직속기관 서비스 이관 시 특이사항 의견 수렴

4. 유지보수 업체 협조사항(사전작업)

- 웹취약점 점검 수행 및 조치 및 공문발송
- 서비스 점검 시나리오 작성 및 제출
- Test 전환 및 서비스 점검 진행
- 연계서비스 확인 및 방화벽 정책 정리
- 이관서비스 서버 및 DB 재기동 등 작업수행(서비스 이상유무 체크)
- 서비스 점검 수행 및 점검 결과 제출
- AP서비스에 대한 장애발생 시 공동대응 수행
- 서비스 이관 실행시 본청(기록원) 상주 근무(금요일 14:00 ~ 토요일 18:00)

5. 주요 Task별 역할

○ 주요 Task별 역할 정의


순번	작업 구분	기관 담당자	기관 유지보수 사업자	비고
1	사전작업	- 소스 취약점 점검결과 공문제출 - 서비스 점검 시나리오 작성 제출	- 소스 취약점 점검 및 조치 - 서비스 점검 시나리오 작성	
2	Test 전환 점검 (오픈2주전)	TEST 전환대상 서버 확인 승인	TEST 전환대상 서버 확인 (CPU, 메모리, Disk)	
		방화벽 점검 승인	방화벽 점검	
		모니터링	- VM 정상 기동 여부 확인 - OS 로그 점검	
		모니터링	- 네트워크 설정 변경 확인 - IP 변경에 따른, 애플리케이션/소스 네트워크 설정 변경 - 주요 애플리케이션 정상 동작 여부 확인 - Test 서비스 점검 진행	
		신규 서비스 기동(WEB,WAS,DB) 확인	신규 서비스 기동(WEB,WAS,DB) 확인	
		외부 연계 테스트 진행 확인	외부 연계 테스트 진행	
		Test 서비스 점검 진행 확인	Test 서비스 점검 진행	
		Test 서비스 점검 완료 후 점검내용 제출	Test 서비스 점검 완료 후 점검내용 작성	
전환당일				
3	전환 대상 서버 확인	전환대상 서버 확인 승인	전환대상 서버 확인 (CPU, 메모리, Disk)	
4	전환 환경 준비	방화벽 점검 승인	방화벽 점검	
5	서비스 종료	- 전환 일정 사용자 공지 확인 - WEB,WAS,DB 종료 확인	- 전환 일정 사용자 공지 안내 (WEB방화벽 공지포함) - 전환 대상 서비스 종료(WEB,WAS,DB)	
6	Source 선택	모니터링(통합사업자 진행)	모니터링(통합사업자 진행)	
7	Destination 선택	모니터링(통합사업자 진행)	모니터링(통합사업자 진행)	
8	전환 옵션 설정	모니터링(통합사업자 진행)	모니터링(통합사업자 진행)	
9	마이그레이션 실행	모니터링(통합사업자 진행)	모니터링(통합사업자 진행)	
10	VM 부팅 확인	모니터링	- VM 정상 기동 여부 확인 - OS 로그 점검	
11	서비스 검증	모니터링	- 데이터/파일 무결성 검증 - 네트워크 설정 변경 확인 - IP 변경에 따른, 애플리케이션/소스 네트워크 설정 변경 - 주요 애플리케이션 정상 동작 여부 확인 - 서비스 오픈 전 서비스 점검 진행	
12	서비스 전환	모니터링	- DNS 전환 확인 - 신규 서비스 기동(WEB,WAS,DB) 확인	
13	테스트	서비스 점검 진행	- 외부 연계 테스트 진행 - 오픈 후 서비스 점검 진행	
14	서비스 안정화	모니터링	- 서비스 로그, DB 세션 정상 여부 확인 - 리소스 사용량 및 성능 모니터링	

6. 서비스 이관 대상 및 일정

구분	기관명	업무명	웹취약점 점검	서비스전환일정	비고
직속 기관	경기도교육정보기록원 (현장정보지원부)	학교정보화현장지원시스템	2월말	2026.3.6.~7	
	경기도교육정보기록원 (현장정보지원부)	경기교육모아(교수학습분야 홈페이지 통합시스템)	2월말	2026.3.13.~14	교육모아
	경기도교육청북부유아 체험교육원	대표홈페이지	2월말	2026.2.27.~28	시범 (양평)
	경기도교육청안전교육관	대표홈페이지	2월말	2026.3.6.~7	
	경기도교육청북부연수원	대표홈페이지	2월말	2026.3.6.~7	
	경기도교육청학생교육원	대표홈페이지	2월말	2026.3.6.~7	
	경기교육청중앙교육 도서관	통합홈페이지	2월말	2026.3.27.~28	
		통합자료관리시스템	2월말	2026.3.27.~28	
		좌석예약홈페이지	2월말	2026.3.27.~28	
		정보나루	2월말	2026.3.27.~28	
		챗봇서버	2월말	2026.3.27.~28	
		자료검색대(K-CMS)	2월말	2026.3.27.~28	
		책이음	2월말	2026.3.27.~28	
	교육모아 HCI서버에 할당	미디어교육센터	2월말	2026.3.13.~14	교육모아
		공용차량배치	2월말	2026.3.13.~14	교육모아
		남부연수원 연수시설예약	2월말	2026.3.13.~14	교육모아
본청	정보화담당관	대표홈페이지	3월말	2026.4.24.~25	
		교육용 클라우드서비스 지원시스템	3월말	2026.4.17.~18	
	생활교육과	온마음터 학교폭력 사안처리종합지원시스템	3월말	2026.4.17.~18	
	시설과	설계공모심사시스템	3월말	2026.4.17.~18	
		신기술·특허공법 선정시스템	3월말	2026.4.17.~18	
		교육시설공사관리 플랫폼 구축	3월말	2026.4.17.~18	
	정책기획관	정책제안 플랫폼 (e정책장터)	3월말	2026.4.10.~11	교육모아
		기관평가시스템	3월말	2026.4.10.~11	양평
		기관평가시스템(대국민)	3월말	2026.4.10.~11	
	지역교육정책과	공유학교 통합시스템	3월말	2026.4.10.~11	가평
	진로직업교육과	AI 기반 진로진학시스템	3월말	2026.4.10.~11	
	정보화담당관	디지털플랫폼 AI학습데이터 저장소 (VM15개)	3월말	2026.4.10.~11	양평

7. API관 방안

1) 서비스 이관 절차 (VMware vMotion 이용 시)

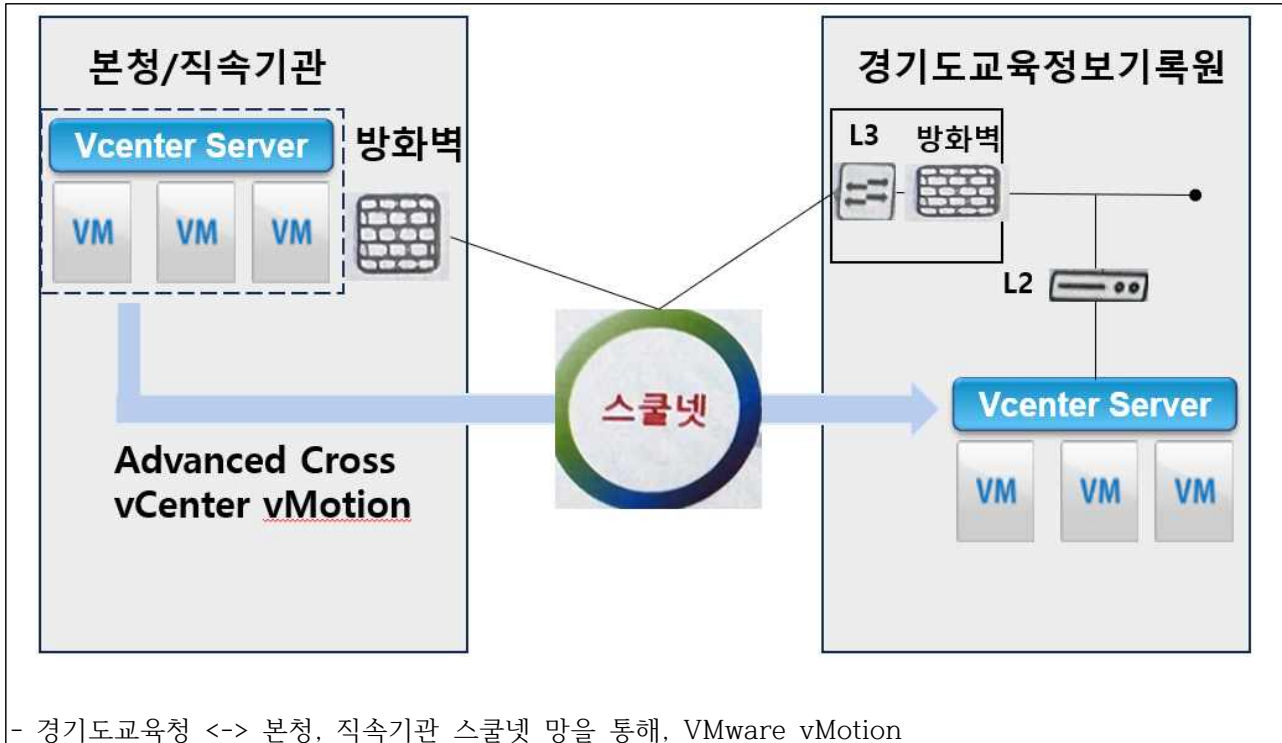


2) 작업 절차 (VMware vMotion 이용 시)

순번	작업 구분	작업 상세 내용	작업담당
1	전환 대상 서버 확인	- 동일 VM 여부 확인 - OS 버전, CPU / 메모리 / 디스크 용량 확인 - IP, 호스트네임, 서비스 포트 확인	사업단 기관 유지보수
2	전환 환경 준비	- VMware vCenter / ESXI 할당 자원 확인 - 네트워크 망 구성 확인 - 방화벽 점검	사업단
3	서비스 종료	- 전환 일정 사용자 공지 안내 - 전환 대상 서비스 종료	기관 유지보수
4	Source 선택	- 홈 -> 호스트 및 클러스터 - VM Tap에서 해당 가상 시스템을 선택 - Cross vCenter Server 내보내기를 선택	사업단
5	Destination 선택	- vCenter Server 및 ESXI 호스트 지정 - Datastore 및 VM 네트워크 지정	사업단
6	전환 옵션 설정	- 데이터 스토어 설정 - 클러스터 설정 - 디스크별 구성 - 네트워크 선택	사업단
7	마이그레이션 실행	작업 로그 모니터링	사업단
8	VM 부팅 확인	- VM 정상 기동 여부 확인 - OS 로그 점검	사업단 기관 유지보수
9	서비스 검증	- 데이터 무결성 검증 - 네트워크 설정 변경	사업단 기관 유지보수

		• IP 변경에 따른, 애플리케이션/소스 네트워크 설정 변경 • 주요 애플리케이션 정상 동작 여부 확인 • 서비스 오픈 전 기능 테스트 진행	
10	서비스 전환	• DNS 전환 • 신규 서비스 기동	사업단 기관 유지보수
11	테스트	• 외부 연계 테스트 진행 • 오픈 후 통합 테스트 진행	사업단 기관 유지보수
12	서비스 안정화	• 서비스 로그, DB 세션 정상 여부 확인 • 리소스 사용량 및 성능 모니터링	사업단 기관 유지보수

3) Data 이관 방법 (VMware Converter 이용 시)

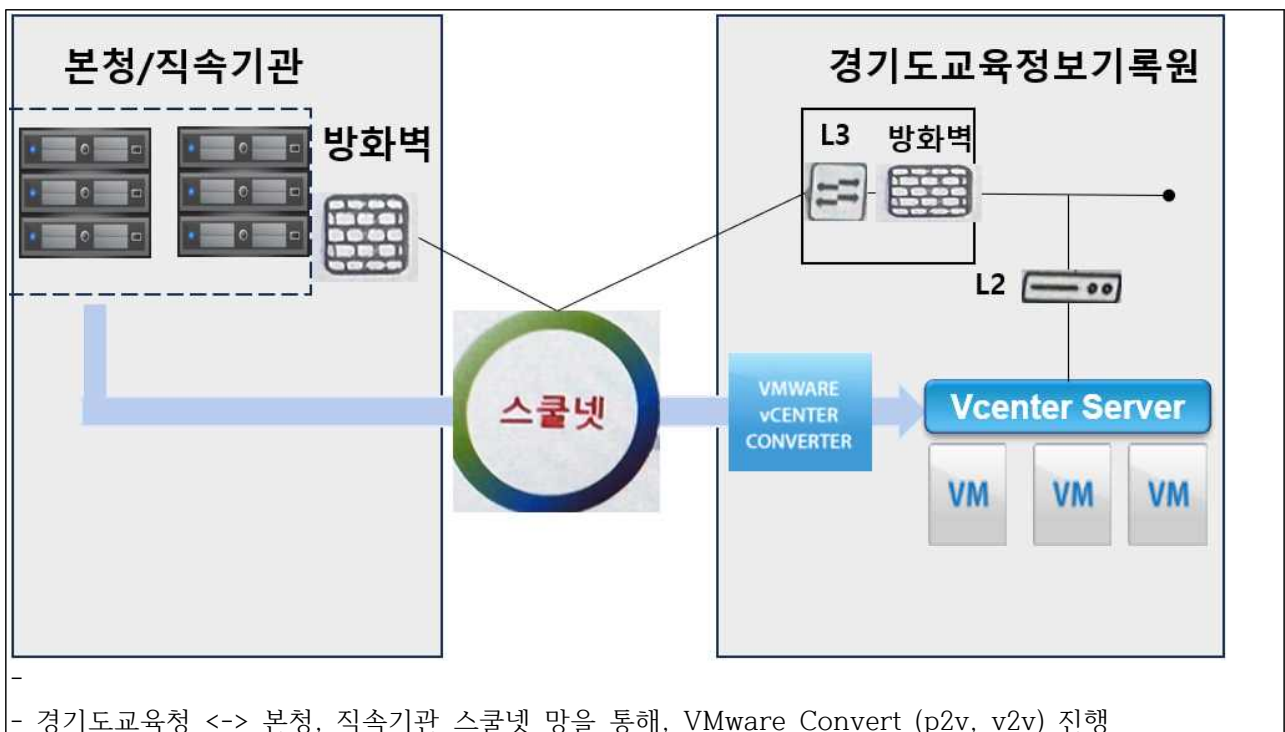

4) Data 이관 절차 (VMware Converter 이용 시)

순번	작업 구분	작업 상세 내용	작업담당
1	전환 대상 서버 확인	• Physical / Virtual Server 여부 확인 • OS 버전, CPU / 메모리 / 디스크 용량 확인 • IP, 호스트네임, 서비스 포트 확인 • 디바이스 (NIC, 전용 드라이버 등) 여부 점검	사업단 기관 유지보수
2	전환 환경 준비	• VMware vCenter / ESXI 할당 자원 확인 • 네트워크 망 구성 확인	사업단
3	서비스 종료	• 전환 일정 사용자 공지 안내 • 전환 대상 서비스 종료	기관 유지보수
4	Source 선택	• Physical Machine , Virtual Machine 선택 • Powered-on/Powered-off VM 선택	사업단
5	Destination 선택	• vCenter Server 및 ESXI 호스트 지정	사업단

		• Datastore 및 VM 네트워크 지정	
6	전환 옵션 설정	• DISK 옵션 선택 : Thick / Thin • 볼륨 용량 지정 • CPU/Memory 리소스 자원 할당 • 네트워크 장치 설정	사업단
7	마이그레이션 실행	• Converter Agent 설치 및 데이터 복제 진행 • 작업 로그 모니터링	사업단
8	VM 부팅 확인	• VM 정상 기동 여부 확인 • OS 로그 점검	사업단 기관 유지보수
9	서비스 검증	• 데이터 무결성 검증 • 네트워크 설정 변경 • IP 변경에 따른, 애플리케이션/소스 네트워크 설정 변경 • 주요 애플리케이션 정상 동작 여부 확인 • 서비스 오픈 전 기능 테스트 진행	사업단 기관 유지보수
10	서비스 전환	• DNS 전환 • 신규 서비스 기동	사업단 기관 유지보수
11	테스트	• 외부 연계 테스트 진행 • 오픈 후 통합 테스트 진행	사업단 기관 유지보수
12	서비스 안정화	• 서비스 로그, DB 세션 정상 여부 확인 • 리소스 사용량 및 성능 모니터링	사업단 기관 유지보수

8. 서비스 점검 계획

1) 소스 취약점 점검

가. 소스 취약점 점검

- 1) 소스 취약점 점검은 Sparrow툴을 이용하여 점검하며, 툴에서 나오는 리포팅을 활용하여 조치하며 조치결과 반영을 진행하며 재 점검을 계속 진행. 최종 조치가 완료되면 운영에 소스를 배포하며 점검 진행

나. 사용자 점검(직속기관, 본청)

- 1) 서비스 전환일에 DNS를 전환하여 담당자가 들어올 수 있도록 작업하여 사용자 점검을 진행함
- 2) 첨부파일에 교육지원청에서 점검해야 하는 점검 항목을 참조

다. 서비스 전환

- 1) 시범전환, 1단계 전환, 2단계, 3단계 전환등 순차적으로 서비스 전환을 진행 시 단계적으로 안정적 서비스 전환을 진행토록 함

9. 상황실 운영 방안

1) 상황실 운영 방안

가. 긴급 서비스데스크 설치

- (1) 긴급상황을 위한 서비스 데스크를 상황실안에 설치하며, 전화를 설치하여 긴급상황에 대응 할 수 있도록 준비

나. Whatab 모니터링

- (1) 상황실에서 서비스 전환시점에 Whatap를 통하여 Resource를 모니터링 하며, 문제가 발생하면 즉각적으로 조치 할 수 있는 상황실을 구성

다. 유관업체 비상체계 수립

- (1) 유관업체 비상연락망 및 담당자 비상체계를 수립으로 비상상황에 대비

10. 장애대응 및 원복 방안

가. 서비스 전환시점 장애 발생시 장애 분석 및 수정을 진행하며 3일 이상의 작업시간이 소요될 경우 원복을 진행(DNS설정 변경)

단계		단계명	비고
Step1	최종 Resource 이관	DB이관	
		첨부파일 이관	
		소스 이관	
Step2	서비스 전환	WEB/WAS/DB 재기동	
Step3	DNS 전환	DNS 전환	
Step4	운영 서비스 점검	사업단/본청/직속기관 서비스 점검	사업단/본청/직속기관
Step5	장애발생시	장애 및 오류 분석	
		장애 및 오류 수정	
		DNS 원복	3일 이상 소요될 경우 (금 18:00 ~ 일 24:00)
		Step1부터 재작업	
Step6	재오픈 준비	반영결과 확인	
Step7	시스템 오픈		

11. 서비스 안정화 방안

가. 서비스 안정화는 이관된 서비스가 안정화되기까지 모니터링 및 장애발생시 빠른 장애 대응 방안 수립을 위해 각 관계자와 R&R정의 함

구분	작업	내용
시스템 모니터링	시스템 집중 모니터링	- 시스템 현황 점검, 비상시 관련 전파 및 협조 요청 * 오류사항 발견 시, 당일 조치를 원칙이며, 기능개선 사항은 유지보수 사업자를 통해 우선순위에 따라 시스템 반영
장애처리	기능오류 처리	- 기능오류 발견시 비상연락망 유지보수 사업자 담당자에서 전파 및 기능 오류수정 요청 - 담당자와 협조하여 기능오류 및 개선 대응
	시스템 오류 처리	- 시스템 오류는 통합사업자의 시스템구축에서 대응 - 원인을 분석하여 장애처리 절차에 따라 대응
안정화	모니터링	- 대상 : 전환이 완료된 서비스 - 내용 : 서버 모니터링 결과 보고(전환후 3일간)
	이슈대응	- 안정화 기간동안 이슈가 발생시 즉시 보고 - 이슈 대응방안(해결방안) 작성 후 보고

12. 협조요청사항

가. 서비스 전환일정에 따른 공문 시행 필요

- 1) 본청 직속기관 서비스 점검 담당자 IP 요청(방화벽 오픈 목적)
- 2) 서비스 중단 공지사항 POPUP(서비스 전환일 포함 3일)
- 3) 예) 4단계 서비스 중단 일정 (3.13(금) 18:00 ~ 3.15(일) 24:00)

나. 유지보수 업체와 일정 공유, 소스 취약점 점검 및 조치, 서비스 점검 협업,

다. 서비스 전환시 협업, 서비스 안정화(모니터링) 등 협조가 필요함

라. 사용자 점검은 본청 직속기관 담당자 및 관계자와 함께 점검 수행

[별첨] 본청 직속기관 전체 서비스 현황

구분	기관명	업무명	이관방식	이관여부	비고
직속기관	경기도교육복지종합센터	기관홈페이지	MSA개발	X	
		안성수덕원	MSA개발	X	
		가평수덕원	MSA개발	X	
		연천수덕원	MSA개발	X	
	경기도교육정보기록원 (기록운영지원부)	경기교육수첩	통합이관 제외요청	X	
		경기교육통합메신저		X	
	경기도교육정보기록원 (사이버안전센터)	대표홈페이지	수원통합이관	X	
	경기도교육정보기록원 (현장정보지원부)	학교정보화현장지원시스템		O	
	경기도교육정보기록원 (현장정보지원부)	경기교육모아(교수학습분야 홈페이지 통합시스템)		O	
	경기도교육청남부유아 체험교육원	대표홈페이지	MSA개발	X	
	경기도교육청북부유아 체험교육원	대표홈페이지		O	
	경기도교육청미래과학 교육원	대표홈페이지	MSA개발	X	
		경기SW-AI교육지원센터홈페이지			
	경기도교육청안전교육관	대표홈페이지		X	
	경기도교육청북부연수원	대표홈페이지		O	
	경기도교육청학생교육원	대표홈페이지		O	
	경기교육청중앙교육 도서관	통합홈페이지		O	
		통합자료관리시스템		O	
		좌석예약홈페이지		O	
		정보나루		O	
		챗봇서버		O	
		자료검색대(K-CMS)		O	
		책이음		O	
		성능모니터링	APM통합	O	
		형상관리	형상관리통합	X	
		미디어교육센터		X	
	교육모아 HCI서버에 할당	공용차량배치		O	
		연수시설예약		O	
				O	
본청	정보화담당관	대표홈페이지	MSA이관	O	
		E-book 홈페이지	대표홈페이 통합이관	O	
		교육용 클라우드서비스 지원시스템		X	
		지역자원 정보시스템(빅데이터 담당)		O	
		e-DASAN현장지원	대표홈페이 통합이관	X	
	생활교육과	온마음터 학교폭력 사안처리종합지원시스템		X	
	시설과	설계공모심사시스템		O	
		신기술·특허공법 선정시스템		O	
		교육시설공사관리 플랫폼 구축		O	
	운영지원과	업무협업시스템		O	
	정책기획관	정책제안 플랫폼(e정책장터)		X	
		기관평가시스템		O	
		기관평가시스템(대국민)		O	
	지역교육정책과	통합홈페이지 (경기이름대학)	공유학교 통합	O	
		통합홈페이지 (경기이름학교)	공유학교 통합	X	
		공유학교 통합시스템		X	
	진로직업교육과	AI 기반 진로진학시스템		O	
	법무담당관	법무행정서비스	대표홈페이 통합이관	O	
	정보화담당관	디지털플랫폼 AI학습데이터 저장소	VM10개 이상	X	

○ 주요 Task별 사업간 역할 정의

순번	작업 구분	사업단	기관 유지보수	비고
1	사전작업		- 소스 취약점 점검 및 조치(공문제출) - 서비스 점검 시나리오 작성	
2	전환 대상 서버 확인	- 동일 VM 여부 확인 - OS 버전, CPU / 메모리 / 디스크 용량 확인	- 동일 VM 여부 확인 - OS 버전, CPU / 메모리 / 디스크 용량 확인 - IP, 호스트네임, 서비스 포트 확인 - Physical / Virtual Server 여부 확인 - 디바이스 (NIC, 전용 드라이버 등) 여부 점검	
3	전환 환경 준비	- VMware vCenter / ESXI 할당 자원 확인 - 네트워크 망 구성 확인 - 방화벽 점검		
4	서비스 종료		- 전환 일정 사용자 공지 안내 (WEB방화벽 공지포함) - 전환 대상 서비스 종료(WEB,WAS,DB)	
5	Source 선택	- 홈 ->호스트 및 클러스터 - VM Tap에서 해당 가상 시스템을 선택 - Cross vCenter Server 내보내기를 선택		
6	Destination 선택	- vCenter Server 및 ESXI 호스트 지정 - Datastore 및 VM 네트워크 지정		
7	전환 옵션 설정	- 데이터 스토어 설정 - 클러스터 설정 - 디스크별 구성 - 네트워크 선택		
8	마이그레이션 실행	작업 로그 모니터링	작업 로그 모니터링	
9	VM 부팅 확인	- VM 정상 기동 여부 확인 - OS 로그 점검	- VM 정상 기동 여부 확인 - OS 로그 점검	
10	서비스 검증	- 네트워크 설정 변경 - 주요 애플리케이션 정상 동작 여부 확인	- 데이터 무결성 검증 - 네트워크 설정 변경 확인 - IP 변경에 따른, 애플리케이션/소스 네트워크 설정 변경 - 주요 애플리케이션 정상 동작 여부 확인 - 서비스 오픈 전 서비스 점검 진행	
11	서비스 전환	- DNS 전환 - 신규 서비스 기동(WEB,WAS,DB)	- DNS 전환 확인 - 신규 서비스 기동(WEB,WAS,DB) 확인	
12	테스트	서비스 점검 진행	- 외부 연계 테스트 진행 - 오픈 후 서비스 점검 진행	
13	서비스 안정화	- 서비스 로그, DB 세션 정상 여부 확인 - 리소스 사용량 및 성능 모니터링	- 서비스 로그, DB 세션 정상 여부 확인 - 리소스 사용량 및 성능 모니터링	
